

正 本



啟達聯合建築師事務所南港監造工務所 備忘錄

受文者：臺北市立南港高級中學

正本：臺北市立南港高級中學

副本：

發文日期：中華民國114年06月09日

發文字號：114啟工字第01-079號

聯絡人：李建興

附件：會議記錄*1份

主旨：檢送『臺北市立南港高級中學綜合教學大樓新建工程』114年第89次工地工務會議記錄，詳如附件，敬請查照。

說明：

- 一、旨揭工程施工協調會議紀錄內容，若有工程契約規範及圖說疑義需澄清或契約變更者，仍須依工程契約約定及程序辦理會勘及回復。

啟達聯合建築師事務所南港監造工務所



臺北市政府工務局新建工程處
臺北市立南港高級中學綜合教學大樓新建工程

第 89 次工程協調會簽到表

一、時間： 114年6月5日 星期四 上午09時30分

二、地點：遠碩南港工務所會議室

三、主席：黃金塗

紀錄：李建興

四、簽到：

單位	姓名
臺北市教育局	
臺北市立南港高級中學	
臺北市政府工務局新建工程處工務科南港工務所	陳國瑞
啟達聯合建築師事務所	黃金塗 李建興 陳佩新
遠碩營造股份有限公司	鄭魯奇 劉正宜 黃新越 黃忠賢 王怡君



臺北市立南港高級中學綜合教學大樓 新建工程

工程協調會議

第89次

主辦機關：臺北市政府工務局新建工程處

設計監造：啟達聯合建築師事務所

承包廠商：遠碩營造股份有限公司

遠碩機電股份有限公司

114 年 06 月 05 日

會議：第89次會議		會議日期：114年06月05日		
		會議地點：遠碩南港工務所會議室		
主 席	黃金塗	紀 錄：李建興		
出席(單位)人員	詳簽到簿			
列席(單位)人員	詳簽到簿			
累計預定進度%	55.91%	累計實際進度%	56.02%	累計進度比較%
契約金額	798,765,650元	最近估驗期數	21期	累計估驗金額
				累積估驗金額百分比
				375,543,749元
				49.39%

討論事項：

項次	會議討論事由	會議結論	辦理情形

1.列管等級-A：已完成、B：執行中

2.監造會議辦理情形回復請簡單扼要，如：

a.已完成，提報日期、文號。

b.未完成，預定完成日期。

列管事項須以報表呈現者請逕檢附資料於簡報中。

圖說釋疑：

項次	會議討論事由	會議結論	辦理情形

施工/材料進場申請：

日期	施工項目	辦理情形	備註

報核人員證照期限管控

廠商報核人員

報核類別	姓名	證照	有效期限
工地主任	劉糧源	工地主任	115.10.12
品管工程師(建築)	王怡喬	品管證照	118.05.21
品管工程師(機電)	劉正宜	品管證照	117.04.28
職業安全衛生人員	黃忠賢	勞安證照	116.03.28

監造報核人員

報核類別	姓名	證照	有效期限
監造主任	黃金塗	工地主任	
品管工程師(建築)	林昆彥	品管證照	116.12.15
品管工程師(機電)	李建興	品管證照	118.01.16
職業安全衛生人員	江威濤	勞安證照	115.05.21

CIP會議：

項次	會議討論事由	會議結論	辦理情形




職安討論事項：

項次	會議討論事由	會議結論	辦理情形
1140521-01	各施工樓層臨時廁所設置	請遠碩評估臨時廁所規劃及設置，避免施工人員隨地大小便，造成環境衛生問題。	B



常見缺失：



臺北市立南港高級中學 綜合教學大樓新建工程

第 089 次工務協調會議 第 089 次工作會議

臺北市政府工務局新建工程處

啟達聯合建築師事務所

遠碩營造股份有限公司

114 年 06 月 04 日

目 錄

一	學校待辦事項
二	三周進度說明
三	前次會議事項追蹤
四	現場工作紀錄
五	臨時動議

一、學校待辦事項

配合校方辦理事項

項次	事項	辦理情形	預計完成時間
1	北市港高總字第11460011751號 因本校重大試務活動需要，惠請 同意廠商該期間暫停施工。	114年06月26、27日：全校期末考。 (計2天)	持續配合。

二、三周進度說明

項目		前週								本週								下週						
		05 / 26	05 / 27	05 / 28	05 / 29	05 / 30	05 / 31	06 / 01	06 / 02	06 / 03	06 / 04	06 / 05	06 / 06	06 / 07	06 / 08	06 / 09	06 / 10	06 / 11	06 / 12	06 / 13	06 / 14	06 / 15		
5F梁、版 模板組立	預定進度																							
	實際進度																							
5F梁 鋼筋綁紮	預定進度																							
	實際進度																							
5F版 鋼筋綁紮	預定進度																							
	實際進度																							
五樓版 混凝土澆置	預定進度																							
	實際進度																							
室內鋼梁 防火漆噴塗	預定進度																							
	實際進度																							
泥作 B2F吊線	預定進度																							
	實際進度																							
五樓版 混凝土養護	預定進度																							
	實際進度																							

三、同進度說明

二、三周進度說明

□ 施工進度管制

□ 施工進度報告：截至 114 年 06 月 02 日(星期一)

已用工期：591日曆天	剩餘工期：341日曆天	展延天數：17日曆天 免計天數：61日曆天
預定進度：55.91 %	實際進度：56.02 %	落後：0 % 超前：0.11 %

□ 施工概況：

上周施工工項	本周施工工項	下周施工工項
5F梁鋼筋綁紮。 5F版鋼筋綁紮。 室內鋼梁防火漆噴塗。 泥作吊線施作。	五樓版混凝土澆置。 室內鋼梁防火漆噴塗。 泥作吊線施作。	五樓版混凝土養護。 連通道工程施作。 鋁窗窗戶進料。


三、前次會議事項追蹤

項次	列管事項	執行單位	辦理情形	列管情形	備註
		校方			
		監造			
		承商			
		機關			
		監造			
		承商			

□ 已安排事項：

- 一. 地下室泥作吊線、貼灰誌、黏條子
(05/20由B2F開始施作，預計B2F部分於06/05完成)
- 二. 地下室筏基層防水粉刷
(已施作完成)
- 三. 地下室油漆
(已選色樣，備料後安排進場)
- 四. 階梯教室鋼構防火漆噴塗
(05/19由階梯教室開始噴塗，本周完成並檢測防火時效膜厚)
- 五. 風雨走廊基礎開挖
(已通知學校影響範圍，安排6/5機具進場施工)
- 六. 鋁窗工程
(6/5第一批窗戶進場)

四、現場工作紀錄

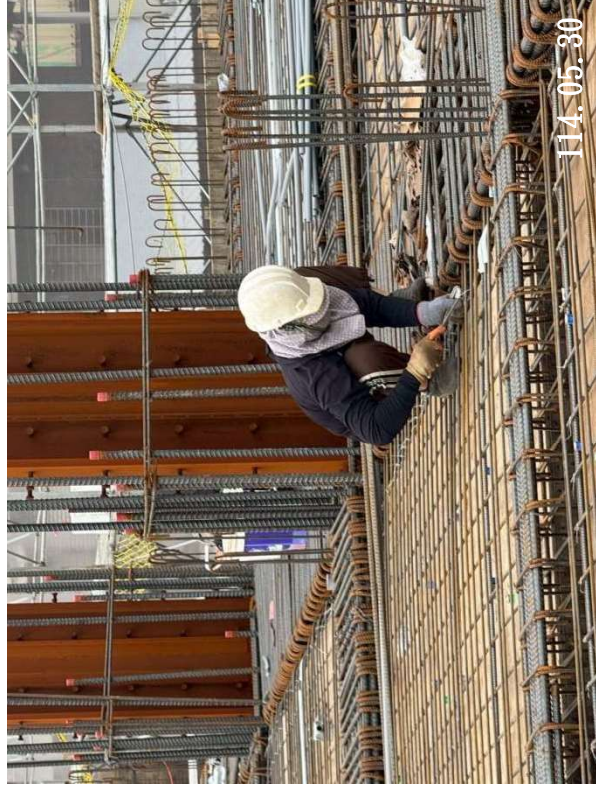

遠碩營造股份有限公司
廠商資格暨材料設備型錄 --- 送審時程管制表

工程名稱：臺北市立南港高中綜合教學大樓新建工程															製表日期(更新)： 114/06/02	
項次	業務/工程項目	預定 送審日期	預定 施作/進場 日期	發包 進度狀況	(承包商)實際送審日期/文號			(監造單位)審查結果日期/文號			(主辦機關)審查結果日期/文號			備註		
					第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次			
25	高梁地板	114/06/17	114/08/16													
26	施工架	113/05/15	113/06/30	已發包	113/03/28			113/03/29(核)			113/04/03			核定		
					南港建字第 1130328049號			113設聯字第 1070200326號			北市工新工字第 1133029972號					
27	牆壁掛簾	114/03/15	114/03/29	已發包	113/12/16			113/12/23(核)					核定			
					(113)環衛(函)字 第1130000281號			113設聯字第 1070200563號								
28	防火隔音門	114/05/28	114/06/26	已發包	114/02/11			114/02/13(核)					核定			
					(114)環衛(函)字 第1140000043號			114設聯字第 1070200615號								
29	外牆金屬	114/03/15	114/6/15	已發包	114/03/03			114/03/06(核)					核定			
					(114)環衛(函)字 第1140000057號			114設聯字第 1070200-637號								

	已送審	未送審
數量	40	20
比例	67 %	33 %

遠碩營造股份有限公司
施工計畫 --- 送審時程管制表

工程名稱: 臺北市立南港高級中學綜合教學大樓新建工程													製表日期(更新): 114/06/02
項次	業務/工程項目	預定 送審日期	預定 施工/進場 日期	(承包商) 實際送審日期/文號			(監造單位) 審查結果日期/文號			(主辦機關) 審查結果日期/文號			備註
				第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	
35	PVC地磚工程分項施工 暨品質管理計畫	114/05/15	114/06/30	114/05/13 (114)建臺(函)字第1140000129號			114/05/14(核) 114駁聯字第 1070200-707號						核定
36	接地系統設備工程分項 施工暨品質管理計畫	113/05/22	113/06/06	113/02/15 南港通字第 1130215027號			113/02/19(核) 113駁聯字第 1070200289號			113/03/07 CZAA 1133014070			核定
37	配管、線工程分項施工 暨品質管理計畫	113/06/30	113/07/15	113/06/17 南港通字第 1130617094號			113/06/18(核) 113駁聯字第 1070200399號			113/06/25 CZAA 11330048314			核定
38	電氣設備工程分項施工 暨品質管理計畫	114/07/15	114/07/30										
39	弱電設備工程分項施工 暨品質管理計畫	114/07/17	114/08/01										

	已送審	未送審
數量	29	20
比例	59.2 %	40.8 %

遠碩營造股份有限公司
施工圖 --- 送審時程管制表

工程名稱:		臺北市立南港高中綜合教學大樓新建工程												製表日期(更新): 114/06/02	
		項次	業務/工程項目	預定 送審日期	預定 施作/進場 日期	(承 包 商) 實 際 送 審 日 期 / 文 號			(監 造 單 位) 審 查 結 果 日 期 / 文 號			(主 辦 機 關) 審 查 結 果 日 期 / 文 號			備 註
						第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	
		7.1	磁磚工程施工圖	114/07/02	114/09/30										
		8.1	鐵件工程施工圖	114/07/02	114/08/31										
		9.1	防火門工程施工圖	114/01/28	114/03/29	113/05/06 南港通字第 1130506067號			113/05/10(核) 113駁聯字第 1070200365號						核定
		10.1	防火捲門工程施工圖	114/01/28	114/03/29	113/06/07 南港通字第 1130607087號			113/06/14(核) 113駁聯字第 1070200397號						核定
		11.1	輕隔間工程施工圖	114/07/02	114/08/31										

	已送審	未送審
數量	25	16
比例	61 %	39 %

□ 下一期工作會議預訂於114年06月11日(星期三) 上午 09:30 召開
